



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
**ДЕПАРТАМЕНТ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ**

пр-т. Шевченка, 4, м. Одеса, 65032, тел./факс:(0482) 32-87-01, приймальня/канцелярія: (048) 718-50-41
E-mail: oblgkh@odessa.gov.ua web: <http://oblgkh.odessa.gov.ua> Код ЄДРПОУ 33659544

№ _____

на № _____

від _____

Голові постійної комісії з питань
житлово-комунального господарства,
паливно-енергетичного комплексу
та енергозбереження
Одеської обласної ради
Семену КОРЖУ

*Про виконання регіональної цільової
програми енергоефективності
за 2020 рік*

Шановний пане Семене!

Департамент інформує про результати виконання протягом 2020 року заходів регіональної цільової програми енергоефективності Одеської області на 2020-2022 роки, що затверджена рішенням Одеської обласної ради від 03.03.2020 № 1233-VII (далі – Програма).

Стратегічною метою виконання завдань Програми з енергоефективності є визначення напрямків скорочення обсягів енергоспоживання в усіх сферах господарювання, підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, забезпечення реалізації загальнодержавної стратегії скорочення споживання природного газу та зменшення енергетичної залежності держави від його імпорту.

Програмою передбачається досягнути:

- підвищення енергетичної ефективності будівель шляхом покрокової термомодернізації з дотриманням нормативних санітарно-гігієнічних вимог;
- підвищення рівня свідомості мешканців, набуття нових знань і навичок з енергоощадності, як результат впровадження інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів;
- впровадження проектів із підвищення енергоефективності водопровідно-каналізаційного господарства і зменшення нераціональних втрат води та енергії;
- мінімізація витрат паливно-енергетичних ресурсів;

– впровадження проектів із заміщення викопних видів палива альтернативними джерелами енергії.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, **419 639,03 тис грн із бюджетів різних рівнів** (рис.1, таблиця 1):

- обласний бюджет – 57 334,18 тис грн;
- районні, міські (міст обласного значення), бюджети ОТГ – 156 351,3 тис грн;
- бюджети сіл, селищ, міст районного значення – 7 966,92 тис грн;
- коштів інших джерел, у тому числі власних коштів підприємств різних галузей економіки - 197 986,0 тис грн.

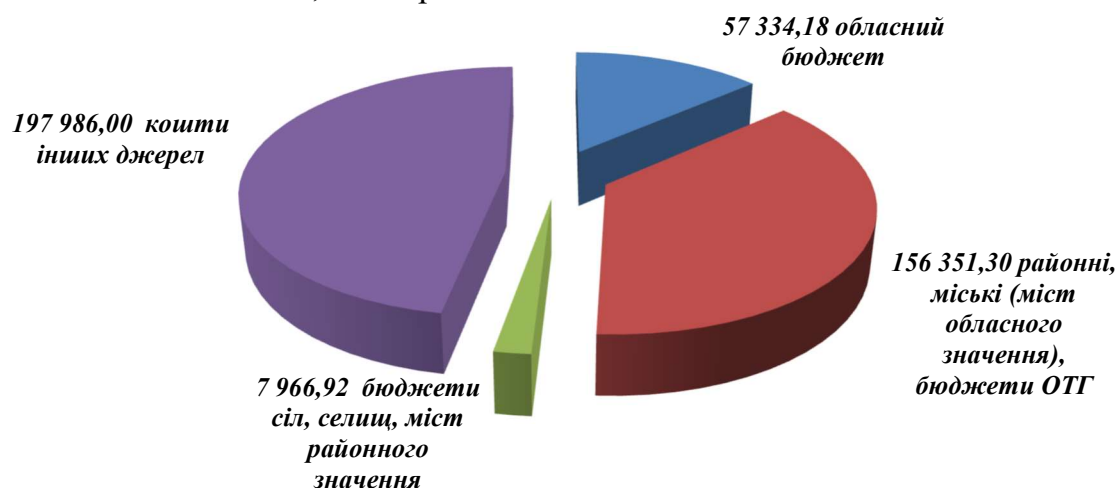


Рис.1 Джерела фінансування Програми на 2020-2022 роки, тис грн.

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування Програми на 2020-2022 роки, грн

Таблиця 1

	ВСЬОГО	2020	2021	2022
Всього за бюджетами , у тому числі:	419 639 030	203 678 750	130 637 640	85 322 640
обласний бюджет	57 334 810	57 334 810	0	0
районні, міські (міст обласного значення), бюджети ОТГ)	156 351 300	62 096 300	59 835 000	34 420 000
бюджети сіл, селищ, міст районного значення	7 966 920	3 161 640	2 402 640	2 402 640
кошти небюджетних джерел	197 986 000	81 086 000	68 400 000	48 500 000

Реалізація заходів Програми дозволить підвищити рівень енергоефективності житлово-комунального господарства, модернізації житлового фонду, скорочення видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в теплоенергетиці, житлово-комунальному господарстві, бюджетних підприємствах та установах та збільшення частки альтернативних джерел енергії в енергобалансі Одеської області (Додаток 1).

Обласним бюджетом Одеської області на 2020 рік, який затверджений рішенням Одеської обласної ради від 20.12.2019 №1199-VII, зі змінами, були скориговані видатки на фінансування програмних інвестицій на загальну суму 55 435,061 тис грн.

Аналіз результатів виконання заходів програми енергоефективності Одеської області за 2020 рік

Модернізація системи електропостачання

В рамках реалізації Інвестиційної програми акціонерного товариства «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» протягом 2020 року на території області за рахунок коштів суб'єкта господарювання проведений ряд заходів по модернізації систем електропостачання (додаток 2).

Відповідно до фінансового плану використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2020 рік передбачалось 52 646,94 тис грн. Протягом звітного періоду проведені реконструкції мереж на суму **52 111,14 тис грн**: Білгород-Дністровський РЕМ, Лиманський РЕМ, Ізмаїльський РЕМ (м.Ізмаїл), Кілійський РЕМ (м. Кілія), Татарбунарський РЕМ (Саратська дільниця), с. Меньяйлівка Татарбунарський РЕМ, Овідіопольський РЕМ (сmt. Великодлинське, с. Надлиманське, с. К.-Бугаз, Біляївський РЕМ (с. Маяки, с. В.Балка с. Х.Балка), Лиманського РЕМ (с. Сичавка, с. Н.Миколаївка та с. Олександрівка).

Модернізація системи теплопостачання

В рамках реалізації «Інвестиційної програми КП «Білгород – Дністровськтеплоенерго» на 2020 рік» за кошти підприємства розроблена ПКД, проведені тендерні процедури по закупівлям та укладені договори з переможцями.

Відповідно до договору від 05.04.2020 №5/05 ТОВ «Котельно-механічний завод «Пархоменко» взяв зобов'язання виконати роботи по об'єкту «Модернізація котла КВ-ГМ-30-150 №6, для несення малих навантажень – 20,00 Гкал/годину, котельня вул. Перемоги, 2», на загальну суму – 4514,4 тис грн (власні кошти підприємства – 914,4 тис грн; співфінансування з місцевого бюджету – 3600,00 тис грн). Протягом 2020 року роботи профінансовано у розмірі 3091,44 тис грн, з них: кошти місцевого бюджету – **2 000,00 тис грн**; власні кошти підприємства – **1091,44 тис грн**.

Завершення робіт по даному об'єкту планується виконати у наступному році.

Відповідно до фінансового плану використання коштів для виконання Інвестиційної програми КП ТМ «ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» протягом року здійснювались заходи по проведенню модернізації систем теплопостачання підприємства (м. Южне, вул. Старомиколаївське шосе, 8). На початок 2021 року роботи виконані на 83,42%, фінансування заходів проводилось за рахунок коштів підприємства **726,98 тис грн** та за рахунок районного бюджету **9800,0 тис грн**.

За рахунок власних коштів КП "ТМ Ізмаїлтеплокомуненерго» здійснили заходи по модернізації системи теплопостачання м. Ізмаїл на загальну суму **3 215,234 тис грн**:

- капітальний ремонт котельні по пр. Суворова, 72-а із заміною 2-х котлів КБНГ-2,5 на котли КСВа-2,0 «ВК-32» - 2589,55 тис грн;
- заміна ділянок теплових мереж котелень по вул. Клушина, 5-а, вул. Нахімова, вул. Транспортників, 27 та вул. І. Франко, 22 – 625,684 тис грн.

За рахунок власних коштів КВЕП «Подільськтеплокомуненерго» на суму **69,6 тис грн** проведена модернізація ШРП (шафа розподілу палива: Котельня №7,

м. Подільськ, вул. Гагаріна, 126 А) та заміна насоса для аварійної підкачки мережної води (Котельня №1, м. Подільськ, пр. Перемоги, 16).

Протягом року в м. Чорноморськ здійснювались заходи по реалізації Інвестиційної програми КП «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеської області на 2020 рік. За рахунок коштів підприємства на суму **8 127,6 тис грн** проведено технічне переоснащення системи розпалювання та горіння котлів в котельні №2 по вул. Садова, 1 в м. Чорноморськ.

Модернізація системи водопостачання та водовідведення

В рамках реалізації «Інвестиційної програми ТОВ «Інфокс» філія «Інфоксводоканал» на 2020 рік» проведено технічне переоснащення хіміко-бактеріологічної лабораторії хлораторної №8 водоочисній станції «Дністер» в м. Біляївка на суму **13 296,36 тис грн**.

Була проведена повна реконструкція хлораторної №8. Крім ремонту приміщень, здійснена заміна комунікацій і трубопроводів «Інфоксводоканал» та встановлене сучасне дороге обладнання для знезараження води – хлоратори європейського виробника «GRUNDFOS». Нове устаткування відрізняється підвищеною надійністю і безпекою, при цьому дозволяє проводити знезараження більш якісно і точно. Завдяки цьому підвищиться і якість питної води.

Річкова вода проходить тривалий етап очищення, який завершується знезараженням у хлораторних. Саме тут знищуються різні бактерії і мікроорганізми, після чого вже чиста питна вода подається в Одесу, де на міських водонасосних станціях додатково знезаражується безпечним гіпохлоритом натрію.

Термомодернізація та ремонт будівель

В закладах бюджетної сфери Іванівського району області проведено ряд заходів щодо термомодернізації та ремонту будівель за рахунок районного бюджету та бюджетів сіл на загальну суму **3 078,25 тис грн** (таблиця 2).

Термомодернізація та ремонт будівель бюджетної сфери Іванівського району

Таблиця 2

Перелік заходів	Найменування об'єкту	Адреса об'єкту	Обсяг фінансування, тис грн
перекриття даху будівлі (1111 кв м)	Опорний заклад "Іванівська загальноосвітня школа I - III ступенів ім. Б. Ф. Дерев'янка"	смт Іванівка, вул. Новоселів, 18 - А	1687,0
капітальний ремонт приміщень їдальні та вентиляційних систем	Баранівська ЗОШ I-III ступенів Іванівської районної ради Одеської області	с.Баранове, вул. Шкільна, 5	214,3
капітальний ремонт приміщень їдальні	Бузинівська ЗОШ I-II ступенів Іванівської районної ради Одеської області	с.Бузинове, вул. Анастасіївська, 120	50,0
капітальний ремонт електропроводки в будівлі	Опорний заклад "Білчанський НВК "ЗОШ I-III ступенів ім.О.Одарія - дитячий садок" Іванівської районної ради Одеської області"	с.Білка, вул. Стрекалова, 68 В	240,0
капітальний ремонт даху приймально-діагностичного відділення	Комунальне некомерційне підприємство «Іванівська центральна районна лікарня» Іванівської районної ради Одеської області	смт. Іванівка, вул. Центральна, 121	886,95
ВСЬОГО			3 078,25

Протягом 2020 року за рахунок обласного бюджету проведена термомодернізація та ремонт будівель на загальну суму **6 345,345 тис грн**, в т.ч. проведено дофінансування за введення технічного нагляду при проведенні капітальних ремонтів закладів охорони здоров'я на суму 38,97 тис грн, виконавець робіт КП «Облтрансбуд» (Додаток 3).

За інформацією Чорноморської селищної ради Лиманського району протягом року проведена заміна вікон в містах загального користування (під'їзди та міжповерхові клітини) в 9 житлових будинків по вул. Гвардійська смт Чорноморське на загальну суму **1 291,954 тис грн**.

На території Березівського району з початку 2020 року проведені капітальні ремонти будівель на загальну суму **1 442,95 тис грн** (рахунок бюджетів сіл): заміна вікон Шевченківський ДНЗ ясла-садок комбінованого типу (с.Шевченкове, вул. Стадіонна); будинки культури с. Гуляївка та с. Ряснопіль.

За рахунок районного бюджету проведена заміна частини даху будівлі Доброславського НВК "ЗОШ I-III ступенів-гімназія" Лиманської районної ради Одеської області на суму **1 474,0 тис грн**.

З початку року на території Ясківської ОТГ (с. Яськи) завершено проведення енергоефективних заходів, що були розпочати у 2019 році, на суму **3 174,148 тис грн** (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду): капітальний ремонт покрівлі Ясківського закладу ЗСО I-III ступенів та капітальний ремонт даху, поточний ремонт та утеплення стелі Ясківського закладу ЗСО I - II ступенів Ясківської сільської ради ОТГ.

На території Любашівського району здійснювались заходи по проведенню капітальних ремонтів приміщень закладу охорони здоров'я та закладів освіти смт Любашівка та с. Троїцьке. З обласного бюджету профінансовано **2 619,489 тис грн** (таблиця 3). За рахунок районного бюджету дофінансовано **28,16 тис грн**.

Фінансування з обласного бюджету закладів бюджетної сфери Любашівського району за 2020 рік

Таблиця 3

Перелік заходів	Найменування об'єкту	Адреса об'єкту	Строк виконання заходу	Обсяг фінансування, тис грн (обласний бюджет)		Виконання заходів, %
				план	факт	
Капітальний ремонт приймального відділення ЦРЛ	Комунальне некомерційне підприємство "Любашівська центральна районна лікарня" Любашівської районної ради Одеської області	смт Любашівка, вул. Софіївська, 47	2020 рік	194,278	180,323	100
Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЦРЛ			2020 рік	250,926	250,926	100
Капітальний ремонт приміщень будівлі	Троїцький НВК "ЗОШ I ступеня - ДНЗ" Любашівського районної ради	с. Троїцьке, вул. Незалежності, буд.25а	2020 рік	1220,000	1202,542	100
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі	Опорний заклад Троїцька ЗОШ I-III ступенів Любашівського району Одеської області	с.Троїцьке, пров. Павла Чібашова, 1	2020 рік	1000,000	985,698	100
ВСЬОГО				2 665,204	2 619,489	

На проведення у 2020 році заходів з термомодернізації та ремонту будинку культури с. Чогодарівка Ширяївського району з сільського бюджету було заплановано профінансувати 563,0 тис грн. На початок 2021 року виконання заходів складає 55,73% на суму **313,77 тис грн**.

За рахунок обласного бюджету проведений капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) у гінекологічному відділенні КНП «Татарбунарська ЦРЛ» Татарбунарської районної ради Одеської області на суму **150,0 тис грн.**

За рахунок бюджетів сіл Татарбунарського району на суму **31,665 тис грн** проведена термомодернізація закладів охорони здоров'я.

Протягом 2020 року з міського бюджету м. Чорноморськ на проведення термомодернізації та ремонту будівель бюджетної сфери, модернізацією системи освітлення та житлового фонду виділено **5 640,67 тис грн**, за рахунок інших коштів профінансовано **28,7 тис грн**. За рахунок районного бюджету в м. Чорноморськ проведена модернізація систем освітлення двох дошкільних закладів освіти на загальну суму **246,8 тис грн**.

За рахунок бюджету м. Біляївка проведений ремонт фасаду (штукатурні роботи, заміна вікон) ЗДО я/с «Буратіно» Біляївської міської ради на суму **15,6 тис грн**.

За 2020 рік профінансовано з Біляївського районного бюджету **10 068,3 тис грн** та бюджету с. Нерубайське **291,5 тис грн** (таблиця 4).

Термомодернізація та ремонт будівель бюджетної сфери Біляївського району Одеської області за 2020 рік

Таблиця 4

Найменування об'єкту, адреса	Районні, міські (МОЗ), бюджети ОТГ, тис грн		Бюджети сіл, селищ, МРЗ, тис грн		Виконання заходів, %
	план	факт	план	факт	
Капітальний ремонт даху будівлі "літера А" № 1 а Паліївської ЗОШ І-ІІ ст.	800	764,3	0	0	100
Капітальний ремонт даху будівлі "літера А" № 29 Граденицької ЗОШ І-ІІ ст.	200	199,2	0	0	100
Капітальний ремонт даху будівлі "літера А" № 29 Граденицької ЗОШ І-ІІ ст.	800	784,3	0	0	100
Капітальний ремонт даху зі встановленням водостічної системи будівлі "літера Б" №7 Августівської ЗОШ І-ІІІ ст.	1490	1426,4	0	0	100
Капітальний ремонт даху будівлі "літера А" початкової школи №2 в Дачненській ЗОШ №1 І-ІІІ ст.	650	569,7	0	0	100
Капітальний ремонт даху (частково)зі встановленням водостічної системи будівлі "літера А" №3 а Іллінської ЗОШ І-ІІІ ст.	1000	983,2	0	0	100
Капітальний ремонт даху з встановленням водостічної системи будівлі початкової школи "літера А" №6 Іллінської ЗОШ І-ІІІ ст.	800	769,4	0	0	100
Капітальний ремонт даху (завершення) зі встановленням водостічної системи Петрівської ЗОШ І-ІІІ ст.	1125	1119,1	0	0	100
Капітальний ремонт даху (частково) В.Дальницького НВК "школа - гімназія"	1490,0	1464,3	0	0	100
Капітальний ремонт даху площі Партизанів буд. №1 Нерубайського НВК "школа - гімназія"	600	504,7	0	0	100
Капітальний ремонт даху (завершення) Усатівського НВК "школа - гімназія"	750	747,2	0	0	100
Капітальний ремонт (частковий) першого поверху приміщення поліклініки амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. В.Дальник та заміна 24 вікон	300	293,8	0	0	100
Капітальний ремонт даху сільського клубу в с. Червона Гірка Кам'янської с.р.	145	143,5	0	0	100
Капітальний ремонт фасаду та утеплення фасаду ДНЗ "Ромашка" с. Нерубайське	0	0	299	291,5	100
Капітальний ремонт даху Усатівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини	300	299,2	0	0	100
ВСЬОГО	10 450,0	10 068,3	299	291,5	

З початку року в селах Павлівка, Садове та Теплиця Арцизького району проведені капітальні ремонти фасадів закладів дошкільної освіти за рахунок бюджетів сіл на суму **1 547,0 тис грн**. Протягом звітної періоду з бюджету сіла в повному обсязі профінансований капітальний ремонт танцювальної зали та фас будинку культури с. Павлівка у розмірі **700,0 тис грн**.

На умовах співфінансування (обласний бюджет **2 000,0 тис грн** та районний бюджет **1 542,0 тис грн**) проведена реконструкція частини головного корпусу КНП «Кілійська багатопрофільна лікарня» для розміщення відділення невідкладної медичної допомоги по вул. Кубишкіна,19 в м. Кілія. Також, за рахунок районного бюджету на території с. Шевченкове Кілійського району проведені: капітальний ремонт будівлі комунальної власності та гаража по вул. Чернишевського,14 (**466,0 тис грн**); поточний ремонт покрівлі Шевченківської амбулаторії ЗПСМ КНП «КЦПМСД» (**150,0 тис грн**).

У місті Балта Балтської ОТГ Одеської області здійснені заходи по проведенню капітального ремонту та благоустрою території ДНЗ ясла-садок №6 "Зірочка", який розташований по вул. Гагаріна, 77. З обласного бюджету профінансовано **1 157,47 тис грн**.

На проведення заходів з термомодернізації та ремонту будівель бюджетної сфери Розділянського району області з бюджетів різних рівнів профінансовано 10 914,04 тис грн: обласний бюджет – **2 235,04 тис грн**; районний бюджет **3 650,09 тис грн**; сільські бюджети - **5 028,91 тис грн** (Додаток 4).

Реконструкція амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Білине по вул. Привокзальна, 28 (Балтський район) проведена на умовах співфінансування: субвенція з держбюджету **3 945,4 тис грн**, з районного бюджету профінансовано **1 930,0 тис грн**.

Також, на умовах співфінансування (субвенція з держбюджету **10 000,0 тис грн**, районний бюджет **200,342 тис грн**) проведена реконструкція приймального відділення екстреної медичної допомоги та прилеглої території КП «Балтська багатопрофільна лікарня» Балтської міської ради Одеської області за адресою вул. Любомирська,344 м. Балта.

З міського бюджету м. Южне на проведення капітальних ремонтів фасадів з утепленням стін було витрачено **10 072,613 тис грн**:

- КДЗ «Южненський міський ЯС №1 «Золота рибка» комбінованого типу;
- КЗ «Южненська ЗОШ I-III ступенів №1 Южненської міської ради.

За рахунок коштів КП Ізмаїльської міської ради "Житсервіс" проведена заміна дерев'яних вікон у під'їздах житлових будинків на металопластикові, скління у під'їздах житлових будинків, ремонт покрівлі та фасадів житлових будинків на суму **14 846,8 тис грн**. На проведення термомодернізації та ремонту будівель бюджетної сфери Ізмаїльського району з обласного бюджету за 2020 рік профінансовано **4 688,041 тис грн**.

Проведений капітальний ремонт (заміна вікон) у Великодолинському НВК «ЗОШ I-III ступенів-лицей» в селищі Великодолинське Овідіопольського району Одеської області за рахунок обласного бюджету на суму **399,143 тис грн**.

Капітальний ремонт будинків культури в с. Зоря та с. Плахтіївка Саратського району профінансовано з обласного бюджету на суму **747,260 тис грн**.

Протягом року з обласного бюджету профінансовано **138,207 тис грн** на проведення термомодернізації та ремонту закладів освіти та культури Тарутинського району.

За рахунок районного бюджету протягом звітного періоду проведено зовнішнє утеплення фасаду будівлі опорного закладу «НВК «Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів – дошкільний заклад» смт Затишшя Захарівського району Одеської області на загальну суму **570,8 тис грн**.

На проведення термомодернізації та ремонту закладів освіти та охорони здоров'я Захарівського району за рахунок обласного бюджету на 2020 рік заплановано витратити 3 545,0 тис грн. З початку профінансовано **2 414,872 тис грн** (таблиця 5).

Термомодернізація та ремонт закладів освіти та охорони здоров'я Захарівського району за рахунок обласного бюджету

Таблиця 5

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Разом видатків на 2020 рік, тис грн	Профінансовано, тис грн	Виконання заходів, %
Капітальний ремонт (зовнішнє утеплення південно-східної частини фасаду) КЗ "НВК "Загальноосвітній навчальний заклад I- III ступенів – ДНЗ ", с. Перехрестове, вул.Шкільна, 1	610,0	0	0
Капітальний ремонт фасаду та отмостки ФАПУ в с. Мар'янівка	250,0	0	0
Капітальний ремонт даху та фасаду будівлі КЗ «Захарівська дитяча – юнацька спортивна школа»	905,0	905,0	100
Капітальний ремонт приміщення приймального відділення Комунального некомерційного підприємства «Захарівська центральна районна лікарня»	1 480,0	1 209,876	
Капітальний ремонт (заміна вікон) в КЗ "НВК "Загальноосвітній навчальний заклад I-II ступенів - ДНЗ" с.Майорське	300,0	299,996	100
ВСЬОГО	3 545,0	2 414,872	

За рахунок обласного бюджету проведений капітальний ремонт даху та водосточної системи будинку культури с.Баннівка Болградського району на суму **250,0 тис грн**.

Капітальний ремонт будівлі КНП "Вилківська міська лікарня» Вилковської міської ради по вул. Різдва, 55 м. Вилкове Кілійського району проведений за рахунок обласного бюджету на суму **1 157,471 тис грн**.

03 березня 2020 року на черговому засіданні Одеської обласної ради затверджено обласну цільову програму компенсації частини кредитів, які беруться населенням області (фізичними особами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, ЖБК) для впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житла на 2020 рік. Реалізація заходів Програми планувалась за рахунок обласного бюджету, районних, міських (міст обласного значення) та бюджетів об'єднаних територіальних громад. Протягом 2020 року фінансування з обласного бюджету не здійснювалось.

Місцеві програми відшкодування частини суми/відсотків за кредитами населення та ОСББ прийняті у м. Одесі, м. Чорноморськ, м. Болград, м. Балта, м. Білгород-Дністровський, Арцизькому та Ананіївському районах. На умовах співфінансування провадяться заходи з енергозбереження, реконструкції і

модернізації багатоквартирних будинків із місцевих бюджетів м. Южне та Біляївська ОТГ.

За 2020 рік перевагами місцевих програм на потреби термомодернізації житлових будівель, впровадження інших енергоефективних заходів скористалися 99 позичальників на загальну суму **14,453 млн грн.** (Додаток 5).

Ремонт вуличного освітлення, встановлення світлодіодних ламп

Протягом звітного періоду на території Розділянського району за рахунок сільських бюджетів та бюджету м. Роздільна виконані роботи із капітального ремонту мереж вуличного освітлення на суму **1 626,32 тис грн.**

Проведений капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (17,6 км) смт. Саврань по вул. Соборна, Малярова та Ковпака (в т.ч. замінені ртутні лампи на світлодіодні та встановлено 356 нових світлодіодних ламп). На проведення заходів з селищного бюджету витрачено **1 367,9 тис грн.**

За рахунок коштів міського бюджету виконані роботи з капітального ремонту зовнішнього освітлення на території міста Теплодар на суму **809,636 тис грн.**

З міського бюджету м. Южне на придбання 22 світлодіодних світильників Ecolight EU-ДКУ-19-56-0260-67X (52 Вт) для мереж зовнішнього освітлення було виділено **1 066,56 тис грн.**

Протягом звітного періоду Табаківською сільською радою Болградського району проведено облаштування системи вуличного освітлення та встановлені світлодіодні лампи, загальна вартість робіт склала **243,0 тис грн.**

На території Іванівського району за рахунок районного бюджету на загальну суму **392,71 тис грн** проведені наступні заходи: встановлено 61 світлоточку вуличного освітлення тротуарів смт Іванівка на суму 129,0 тис грн; проведений капітальний ремонт вуличного освітлення смт Іванівка та с. Бузинове на суму 263,71 тис грн.

На території Ширяївського району з сільських бюджетів с.Вікторівка, с. Маркевичеве, с. Катерино-Платонівка, с.Малігонове, с. Чогодарівка, с. Старі Маяки, с. Армашівка, с. Армашівка, с. Бердинове профінансовано **408,14 тис грн** на ремонт вуличного освітлення населених пунктів із встановлення світлодіодних ламп.

На умовах співфінансування проведений ремонт мереж вуличного освітлення с. Онилове Захарівського району на загальну суму 500,0 тис грн (обласний - **300,0 тис грн**, сільський - **200 тис грн**). Обласний бюджет профінансував **250,0 тис грн** на ремонт зовнішнього освітлення с. Майорське, за рахунок сільського бюджету в с. Павлівка виконані роботи на суму **579,0 тис грн.** За рахунок районного бюджету проведена реконструкція мереж вуличного освітлення смт. Затишшя та с. Торосовена на суму **964,4 тис грн.**

На території Балтського району за рахунок бюджетів сіл (**137,0 тис грн**) та коштів небюджетних джерел (**17,0 тис грн**) проведені заходи щодо встановлення світлодіодних ламп: с. Ракулове, с. Кринички, с. Шляхове, с. Піщана, с. Чернече та с. Гербіне.

За рахунок коштів міського бюджету виконані роботи з модернізації мереж вуличного освітлення на території міста Ізмаїл на суму **17 500,0 тис грн.**

Протягом року за рахунок сільських та селищного бюджетів (Новоселівська та Ройлянська сільська рада, Саратська селищна рада) виділено **796,0 тис грн** на проведення капітальних ремонтів мереж вуличного освітлення.

З бюджетів сіл Біляївського району протягом 2020 року на проведення заходів з ремонту та будівництва мереж вуличного освітлення з встановленням світлодіодних ламп профінансовано **2 737,267 тис грн** (таблиця 6).

Капітальний ремонт вуличного освітлення на території Біляївського району протягом 2020 року

Таблиця 6

Перелік заходів	Населений пункт (вулиця)	Обсяг фінансування, тис грн		Виконання заходів, %
		план	факт	
Капітальний ремонт вуличного освітлення	с. Латівка Августівської сільської ради по вул.Іванова	330	330	100
	с. В Дальник вул. Вигодянська, Садова та пров. Вигодянський	240	237,4	100
	с.Вигода (Плодове)	23,96	23,96	100
	вул. Їжаковського та вул. Лиманська с. Паліївка	307,767	307,767	100
	вул. Новоселів та вул. Корольова	248,5	248,5	100
	вул. Миру, пров. Миру с. Градениці	127,47	127,47	100
	вул. Миру с. Кам'янка	250	248,4	100
вул. Покровська та шкільна с. Маринівка	81,1	81,0	100	
Будівництво мереж вуличного освітлення	вул. Шахтарська, Больнична, Колхозна, Виноградна, Спортивна, Зв'язна, Тиха, А.Вавілова, Кленова, Ломоносова, І.Франка, Нова, Клубна, Бхмельницького, Балтовська, пров. Верхній, Горького, Шампанський в с.Дачне (з технаглядом)	475,57	475,57	100
	вул. Степова, Чижикова, Титова, Дальницька с. Дачне (з технаглядом)	226,02	226	100
	вул. Армійська, Грушевського, пров. Аптечний, Горького, вул. Академічна, Миру, пров. Кошового, вул. Пшенична, Абрикосова, Квіткова, Терешкової, Гагаріна, Пирогова, Ольгівська, Паркова, Космонавтів, пров. Київський, Морський, вул. Володимирівська с.Дачне (з технаглядом)	431,1630	431,2	100
ВСЬОГО		2 741,55	2 737,267	

За рахунок бюджету м. Біляївка встановлені світлодіодні світильники по просп. Незалежності, вул. От. Головатого, вул. Рябушкіна, вул. Садова, вул. Успенська на суму **91,6 тис грн**.

З початку 2020 року на території Березівського району проведений капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за рахунок бюджетів сіл на загальну суму **1 555,7 тис грн**: с. Яснопіль, с. Кудрявка, с. Виноград, с. Чижево, с. Новоселівка с. Михайло-Олександрівка, с. Веселинівка, с. Демидове.

За рахунок бюджету Березівської міської ОТГ в сумі **268,155 тис грн** проведений капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Вікторівка (вул. Лермонтова) та м. Березівка (вул. Пристанційна).

На території Красносільської ОТГ Лиманського району (с. Іванове, с. Красносілка, с. Корсунці, с. Ільчанка та с. Кубанка) проведений капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за рахунок районного бюджету на суму **6 720,398 тис грн**.

За рахунок бюджетів сіл Садове та Прямобалка Арцизького району проведені капітальні ремонти вуличного освітлення на суму **295,88 тис грн**.

На території Приморської сільської ради та Карналіївської сільської рад за рахунок бюджетів сіл з початку року проведені капітальні ремонти вуличного освітлення на суму **61,5 тис грн**.

На території Любашівської селищної ОТГ (с. Бобрик Перший, с. Бобрик Другий, с. Янишівка, с. Арчепитівка та смт Любашівка) за рахунок бюджету ОТГ з початку року проведений ремонт вуличного освітлення на суму **650,0 тис грн**.

За рахунок бюджету сіла Великовасилівка Любашівського району проведений капітальний ремонт вуличного освітлення на суму **270,0 тис грн**, (прокладено 3,8 км вуличного освітлення, встановлено 40 енергозберігаючих світлодіодних ламп).

За рахунок бюджетів сіл Кодимського району протягом звітного періоду на суму **2 394,87 тис грн** проведені заходи з ремонту вуличного освітлення та встановлення світлодіодних ламп (таблиця 7).

**Капітальний ремонт вуличного освітлення
на території Кодимського району протягом 2020 року**

Таблиця 7

Перелік заходів	Населений пункт району	Строк виконання заходу	Обсяг фінансування, тис грн (сільський бюджет)		Виконання заходів, %
			план	факт	
Будівництво мережі вуличного освітлення	смт. Слобідка	2020	1905,83	923,3	48,45
Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення	с. Лисогірка	2020	380,0	371,09	100
Будівництво мережі вуличного освітлення	с. Петрівка	2020	96,59	86,04	100
Реконструкція мереж вуличного освітлення	с. Олексіївка	2020	582,48	570,26	100
Реконструкція мереж вуличного освітлення	с. Пірижна	2020	444,18	444,18	100
ВСЬОГО			3 409,08	2 394,87	

На території Окнянської селищної ради (смт Окни, сіл Антонівка, Гулянка, Довжанка, Римарівка, Новосамарка) за рахунок бюджетів сіл та селищ протягом 2020 року проведений ремонт вуличного освітлення та встановлені світлодіодні лампи на суму **1 269,7 тис грн**.

За рахунок обласного бюджету (**1 498,85 тис грн**) та бюджетів сіл та селищ (**114,34 тис грн**) проведений ремонт систем освітлення Левадівського старостинського округу, території Миколаївської селищної ради та Настасіївської сільської ради Миколаївського району.

На території Кілійського району за рахунок районного бюджету проведений ремонт вуличного освітлення на суму **316,66 тис грн**: капітальний ремонт вул. Урожайна в м. Кілія та вул. Белінського в с. Шевченков; поточний ремонт освітлення вулиць с. Помазани.

З районного бюджету на проведення капітального ремонту мереж ізольованої лінії СІП 4-70 ВЛІ-0,4 КВ (Білгород-Дністровський район, с. Бритівка, вул. Миру, 2а) профінансовано **199,78 тис грн**.

В м. Білгород-Дністровський (вул. Переможненська, вул. Сонячна, вул. Ізмаїльська, вул. 30 років Перемоги, вул. Кишинівська, вул. Тимчишина, вул. Лесі Українки, вул. Козацька та вул. Першотравнева) за рахунок обласного бюджету проведений капітальний ремонт вуличного освітлення на суму **915,55 тис грн**.

На території м. Балта та населених пунктах Балтської ОТГ на мережах вуличного освітлення встановлені світлодіодні лампи на суму **1 930,0 тис грн**.

За рахунок обласного бюджету проведений капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Утконосівка Ізмаїльського району на суму **499,007 тис грн**.

Капітальний ремонт вуличного освітлення проведений в с. Долинське та с. Шелехове Ананьївського району, з обласного бюджету виділено **1 122,5 тис грн**.

За рахунок бюджетів сіл Мигаї, Соше-Острівське, Новоборисівка та Полішпакове Великомихайлівського району на суму **522,0 тис грн** проведені роботи по реконструкції та ремонту вуличного освітлення, технічне обслуговування електроосвітлення вулиць.

Модернізація систем теплопостачання (встановлення енергоефективного обладнання), технічне переоснащення та встановлення нових котлів на альтернативних видах палива

В рамках реалізації «Міської комплексної програми енергоефективності у м. Одесі на 2017-2021 роки» за 2020 рік на реалізацію заходів Програми з міського бюджету профінансовано **35 897,8 тис грн**:

- «Проектування, реконструкція, капітальний ремонт теплових мереж, ЦТП, котельень та інших об'єктів теплопостачання, що перебувають на балансі комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси» - 35 269,2 тис грн;
- Реконструкція введення теплотраси в будівлі, розташовані за адресами: м. Одеса, вул. Цегельнозаводська,2, вул. Цегельнозаводська, 2а, вул. Багрицького,12 - 628,6 тис грн.

За рахунок районного бюджету проведено утеплення теплотраси до будівлі Фонтанського НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія" Лиманської районної ради Одеської області на суму **111,0 тис грн**.

З початку року з бюджетів сіл Арцизького району на модернізацію систем теплопостачання витрачено **1 902,0 тис грн**: капремонт центрального опалення та придбання котла для центрального опалення ДНЗ ясла-садок "Радуга" загального типу комунальної власності Задунайської сільської ради; капітальний ремонт систем теплопостачання ДНЗ ясла-садок "Теремок" та "Малютко" загального типу комунальної власності Теплицької сільської ради.

На проведення заходів з модернізації систем теплопостачання (встановлення енергоефективного обладнання), технічного переоснащення та встановлення нових котлів з районного та сільських бюджетів Біляївського району протягом 2020 рік профінансовано 2 446,9 тис грн: районний – **1 408,9 тис грн**, сільські – **1 038,0 тис грн** (таблиця 8).

**Капітальний ремонт систем опалення
на території Біляївського району протягом 2020 року**

Таблиця 8

Перелік заходів	Об'єкт	Обсяг та джерела фінансування, тис грн						Виконання заходів, %
		Всього, у т.ч.		Районні, міські (МОЗ), бюджети ОТГ		Бюджети сіл, селищ, міст районного значення		
		план	факт	план	факт	план	факт	
Капітальний ремонт системи опалення	Дачненський НВК "Школа-гімназія" Біляївського району Одеської області	1450,0	1170,2	1450,0	1170,2	0	0	100
Капітальний ремонт, заміна котлів	Нерубайський НВК "школа-гімназія" Біляївського району Одеської області	240	238,7	240	238,7	0	0	100
Придбання газового котла та реконструкція газової котельні	КП "Набережне"	1010	1010	0	0	1010	1010	100
Капітальний ремонт теплотраси між будівлею котельної ЗОШ та ДНЗ, в тому числі технагляд	Августівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Біляївського району Одеської області та ДНЗ "Світлячок"	28,378	28	0	0	28,38	28	100
ВСЬОГО		2 728,378	2 446,9	1 690,0	1 408,9	1 038,38	1 038,0	

За рахунок бюджету м. Біляївка (**213,8 тис грн**) проведені: ремонт систем опалення Майорівської ЗОШ та Біляївської ДЮСШ; заміна газового котла для ЗДО я/с «Журавлик» Біляївської міської ради.

За рахунок обласного бюджету (**97 тис грн**) та районного бюджету (**3,0 тис грн**) встановлений котел на альтернативних видах палива в комунальному закладі позашкільної освіти «Миколаївська дитяча музична школа» Миколаївської районної ради Одеської області (сmt Миколаївка, вул. Незалежності, 36).

Проведений капітальний ремонт (улаштування мережі опалення) Степанівського міжшкільного НВК (Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Дружби, 3) за рахунок обласного бюджету - **568,2 тис грн**. З бюджету м. Роздільна на реконструкцію теплотраси біля поліклінічного відділення КНПСВТГ Розділянського району "Розділянська центральна районна лікарня» (м. Роздільна, вул. Європейська 14) виділено **37,05 тис грн**. За рахунок районного бюджету придбані енергозберігаючи насоси для мереж опалення у Новоукраїнському НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» та Калантаївській ЗОШ I-III ступенів на суму **41,8 тис грн**.

За рахунок обласного бюджету придбаний за **199,0 тис грн** теплогенератор для опалення будинку культури в с. Лощинівка Ізмаїльського району.

Придбані котли та встановлені системи опалення в адміністративному приміщенні по вул. Лермонтова с. Новоборисівка та в дитячому садочку с. Мигаї Великомихайлівського району за рахунок бюджетів сіл на суму **141,6 тис грн**.

За рахунок обласного бюджету проведений капітальний ремонт теплопостачання КУ "Одеський обласний клінічний медичний центр", м. Одеса, вул. Суднобудівна буд.1, на проведення робіт витрачено **699,873 тис грн**.

Проведена заміна двох котлів на більш енергоємні в Северинівському НВК "ЗОШ I- III ступенів - ДС" Іванівського району за рахунок сільського бюджету на суму **60 тис грн**.

В трьох закладах освіти м. Чорноморськ за рахунок міського бюджету проведена реконструкція індивідуальних теплових пунктів зі встановленням погодинних регуляторів та в Олександрівському будинку культури проведена заміна газового котла на котел з використання гранул з деревини на суму **1 516,02 тис грн**.

За рахунок бюджетів сіл Кочкувате та Білолісся, м. Татарбунари на суму **128,3 тис грн** проведена ремонт систем теплопостачання закладів охорони здоров'я.

Проведена реконструкція котельні Богунівського НВК "ЗОШ I-III ступенів - дитячий садок" Коноплянської сільської ради (Іванівський район, с. Богунове, вул. Садова, 11). З районного бюджету виділено **132,0 тис грн**.

Модернізація системи водопостачання та водовідведення, встановлення енергоефективного обладнання

За рахунок бюджетів сіл Кодимського району на встановлення енергоефективного насосного обладнання в населених пунктах району протягом 2020 року виділено **328,08 тис грн**.

На території м. Рені за рахунок міського бюджету профінансовано **22 161,3 тис грн** на проведення: будівництва (буріння) артезіанської свердловини та водонапірної башти Рожновського по вул. Болградська,119/а; будівництво водопроводів та капітальних ремонтів водопроводів впродовж вулиць міста.

На проведення заходів з капітального ремонту вежі, придбання та встановлення вежі Рожновського за рахунок бюджету с. Армашівка Ширяївського району

профінансовано **532,57 тис грн.** За рахунок коштів КП «Аква-Віта» у розмірі **5,7 тис грн** в с. Миколаївка проведена заміна насоса до водонапірної башти.

На території Любашівської селищної ОТГ (с. Сергіївка, с. Агафіївка, с. Антонівка та смт Любашівка) за рахунок бюджету ОТГ з початку року встановлений АС «Каскад» на артсердловинах на суму **21,0 тис грн.**

За рахунок бюджету сіла Нерушай Татарбунарського району на суму **83,0 тис грн** проведена заміна система водопостачання закладу охорони здоров'я.

На території Окнянської селищної ради (смт Окни, сіл Вижине, Гулянка, Довжанка, Малаївці, Ставрове, Топали, Ткаченко, Тригради) за рахунок бюджетів сіл та селищ проведена модернізація водопостачання та водовідведення, встановлено ефективне обладнання на суму **1 507,8 тис грн.**

З районного бюджету на модернізацію артезіанської свердловини № 144-Е (Білгород-Дністровський район, с. Бритівка) виділено **281,862 тис грн.** За рахунок небюджетних джерел на суму **481,5 тис грн** проведена модернізація систем водопостачання сіл Шабо, Бритівка, Салгани, Привітне та Прибережне.

За рахунок бюджета сіла Кубей Болградського району проведена модернізація системи водопостачання на суму **299,7 тис грн.** Здійснена за рахунок обласного бюджету (**1028,2 тис грн**) реконструкція резервуара запасу води в м. Болград, вул. 25 Чапаєвська дивізії № 87В.

З районного та сільських бюджетів Біляївського району протягом 2020 року на реалізацію заходів з модернізації систем водопостачання та водовідведення, встановлення енергефективного обладнання профінансовано 5040,063 тис грн (районний – **2 886,26 тис грн**, сільські – **2 153,8 тис грн**), таблиця 9.

Модернізація системи водопостачання та водовідведення (Біляївський район)

Таблиця 9

Перелік заходів	Населений пункт (вулиця)	Обсяг та джерела фінансування, тис грн						Виконання заходів, %
		Всього, у т.ч.		Районні, міські (місто обласного значення), бюджети ОТГ		Бюджети сіл, селищ, міст районного значення		
		план	факт	план	факт	план	факт	
Капітальний ремонт водопроводу та системи водопостачання як частина лінійного об'єкту	В.Дальницької НВК "школа - гімназія"	555	517,6	555	517,6	0	0	100
Будівництво ділянки мережі водопостачання житлового масиву	смт.Хлібодарськевул.Тирас польське шосе	500	387,963	500	387,963	0	0	100
Капітальний ремонт водогону	с. Іллінка вул. Нежданова	237	236,9	237	236,9	0	0	100
	с.Іллінка вул. Квіткова	231	230,7	231	230,7	0	0	100
	с.Кагарлик	1513,1	1513,10	1513,1	1513,10	0	0	100
Будівництво водовідведеної системи	вул. Грушевській від №77 до буд. №43 с. Усадове	1157,2	1157,2	0	0	1157,2	1157,2	100
Капітальний ремонт зовнішнього електропостачання станції підкачки	с. В.Дальник	240	237,4	0	0	240	237,4	100
Будівництво водовідвідної системи	вул. 1-Водопянова від буд. №48 до вул. Грушевського с. Усадове	517,12	499,8	0	0	517,12	499,8	100
Капітальний ремонт водовідвідної системи	вул. Балківській	941,0	259,4	0	0	941,0	259,4	27,6
ВСЬОГО		5891,42	5040,063	3036,1	2886,26	2855,32	2153,8	

Проведений капітальний ремонт водоводу по вулиці Отамана Головатого м. Біляївка, з міського бюджету виділено **1 766,0 тис грн**. В рамках реалізації проекту «Реконструкція системи водовідведення та очистки стоків у м. Біляївка» з бюджету міста профінансовано **33 300,0 тис грн**.

За рахунок сільських бюджетів Розділянського району за 2020 рік та за рахунок небюджетних джерел проведені заходи з модернізації систем водопостачання та водовідведення на суму **7 630,7 тис грн** та **15,0 тис грн** відповідно (Додаток 6).

Проведений капітальний ремонт водонапірних башт сіл Новоборисівка, Мигаї, Соше-Острівське, Залізничне, Поплавка та проведені внутрішньо свердловинні роботи в с. Наливайкове за рахунок бюджетів сіл Великомихайлівського району на суму **1873,5 тис грн**.

За рахунок бюджету Березівської міської ОТГ придбана водонапірна вежа на суму **300,0 тис грн** для Виробничого управління ЖКГ м. Березівка.

На території Іванівського району за рахунок обласного бюджету (**299,18 тис грн**) та бюджетів сіл (**365,0 тис грн**) проведена модернізація системи водопостачання: смт Іванівка (1,77км), с. Бузинове (0,1км), смт Петрівка (1,5км).

Встановлення вузлів обліку електричної та теплової енергії, холодної води та газу

Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 № 2119-VIII, зі змінами, визначає засади забезпечення комерційного, у тому числі розподільного, обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг.

Узагальнена інформація по забезпеченню комерційного обліку послуг з постачання теплової енергії та централізованого водопостачання на території області представлена в таблиці 10.

Стан комерційного обліку послуг з постачання теплової енергії та централізованого водопостачання на території області

Таблиця 10

	Теплова енергія, %		Водопостачання, %	
	<i>нежитлові будинки</i>	<i>житлові будинки</i>	<i>нежитлові будинки</i>	<i>житлові будинки</i>
Одеська область	78,2	87	98,7	79,0

У житлових будинках м. Теплодар, м. Южне, Подільського, Любашівського, Ізмаїльського, Великомихайлівського, Саратського, Захарівського та Лиманського, Іванівського районів показник «комерційного обліку з постачання централізованого водопостачання» досяг 100%.

Наближені (тобто показник від 71-99,9%) до стовідсоткового оснащення комерційного обліку з постачання централізованого водопостачання у житлових будинках в розрізі міст та районів представлені на рис. 2.

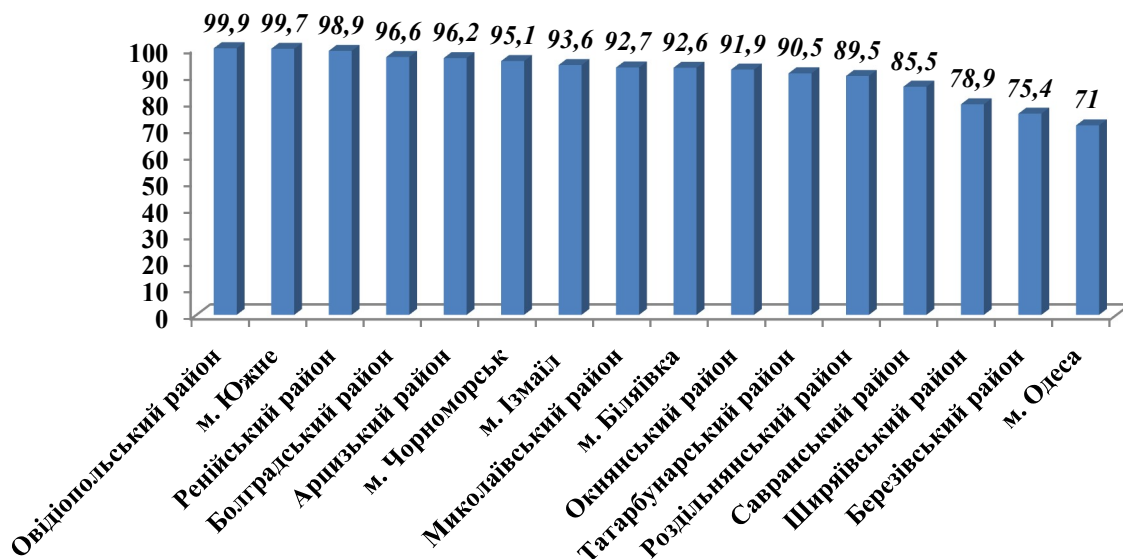


Рис. 2 Оснащеність вузлами комерційного обліку з постачання централізованого водопостачання у житлових будинках, %

В межах реалізації Міської комплексної програми енергоефективності у м. Одеса на 2017-2021 на виконання заходу «Встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії, яка постачається КП «Теплопостачання міста Одеси» з бюджету міста профінансовано **2 755,3 тис грн.**

За рахунок коштів інших джерел (**50,0 тис грн**) на території смт Любашівка (Любашівська селищна ОТГ) встановлено 92 вузла обліку води.

В рамках реалізації програми "Енергоефективність Роздільнянського району 2019-2021 роки" за рахунок районного бюджету придбані GPRS модеми, лічильники газу на суму **64,4 тис грн.**

За рахунок районного бюджету (Біляївський район) проведена заміна лічильника газу для Х.Балківської ЗОШ I-III ст. на суму **30,0 тис грн.**

За рахунок бюджету сіла Новоборисівка Великомихайлівського району встановлені лічильники вуличного освітлення та засобу обліку електроенергії в адмінприміщеннях на суму **21,0 тис грн.**

Новий засіб обліку теплової енергії встановлений на системі теплопостачання комунального некомерційного підприємства «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області за рахунок інших джерел на суму **59,56 тис грн.**

Розробка та впровадження системи енергетичного менеджменту

Відповідно до спільного розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради «Про запровадження електронного енергетичного моніторингу установ бюджетної сфери Одеської області» створена електронна база даних соціальних установ Одеської області, які перебувають у власності громад регіону. На сайті <http://esco.od.ua> Енергомоніторинг Одеської області розміщена інформація по 4366 об'єктам соціальної сфери області.

З метою впровадження постійно діючої системи динамічного моніторингу і отримання інформації щодо фактичного енергоспоживання та температури повітря у приміщеннях підпорядкованих установ у режимі щоденного моніторингу за

показниками лічильників обліку енергетичних ресурсів та температурних приладів на території м. Балта впроваджено Положення про систему енергетичного менеджменту. На даний час використання АІС «Енергосервіс» впроваджено в 13 бюджетних закладах.

Система енергетичного менеджменту відповідно до прийнятого Положення запроваджена на території Красносільської сільської ради Лиманського району.

На території Лиманського району проводиться щотижневий моніторинг споживання електроенергії бюджетними установами, розроблено енергетичні паспорти з розробкою сертифікатів будівель в 29 освітніх навчальних закладах, що складає 86% від загальної кількості.

На підставі «Концепції впровадження системи енергетичного менеджменту м. Южного Одеської області» та «Положення про систему енергетичного менеджменту м. Южного Одеської області» впроваджена постійно діюча система динамічного моніторингу і отримання інформації щодо фактичного енергоспоживання та температури повітря у приміщеннях підпорядкованих установ у режимі щоденного моніторингу за показниками лічильників обліку енергетичних ресурсів та температурних приладів.

В рамках роботи системи муніципального енергомоніторингу та енергоменеджменту до спеціалістів Одеського Муніципального Енергетичного Агентства надходять щоденні дані по енергоспоживанню від 517 муніципальних установ, що дає змогу контролювати витрати ПЕР.

На території Болградського району впроваджена базова автоматизована система моніторингу та керування споживанням паливно-енергетичних ресурсів АІС-Енергосервіс на об'єктах бюджетної сфери району. До системи внесено необхідну інформацію по кожному об'єкту бюджетної сфери окремо (46 об'єктів). Продовжується робота щодо внесення даних споживання енергоресурсів по кожному об'єкту бюджетної сфери району.

В рамках реалізації проекту «Автоматична система управління водоспоживання у м. Біляївка» міського бюджету м. Біляївка витрачено **80,0 тис грн.**

Реалізація заходів з енергоефективності на об'єктах комунальної власності

Законом України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 №2118-VIII визначені правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель та зменшення споживання енергії у будівлях.

Відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону з 01.07.2019 введени в дію вимоги статті 7 «Сертифікація енергетичної ефективності» щодо обов'язкової сертифікації енергетичної ефективності будівель.

З метою забезпечення стовідсоткової сертифікації енергетичної ефективності обов'язкових об'єктів сертифікації облдержадміністрація рекомендувала при формуванні бюджету на 2020 рік розглянути можливість та винести на розгляд відповідних рад питання щодо фінансування заходів з сертифікації енергетичної ефективності будівель (або затвердження програм з енергоефективності / внесення змін до діючих програм).

На території Ананьївського району прийнята «Районна цільова програма з енергоефективності та енергозбереження на 2020-2022 роки», якою передбачено фінансування заходів з сертифікації енергетичної ефективності будівель.

Відділом освіти, молоді та спорту Лиманської райдержадміністрації проведено сертифікації енергетичної ефективності будівель 11 закладів освіти. Підлягають сертифікації після здійснення заходів з термомодернізації будівель адміністративні будівлі: Фонтанської, Визирської, Олександрівської, Кремидівської сільських рад та Новобілярської селищної ради.

Комунальним підприємством «Одеська обласна енергозберігаюча компанія» протягом року проведені енергетичні обстеження 48 об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області з подальшим складанням звіту з енергетичного аудиту.

Для систематизації даних про енергетичну ефективність будівель та моніторингу за дотриманням законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель облдержадміністрація запровадила щопіврічні звіти про результати проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель на території області за звітний період.

Проектування та будівництво об'єктів із використанням відновлювальних джерел енергії

Використання відновлюваних джерел енергії є одним із найбільш важливих напрямів енергетичної політики області, спрямованої на заощадження традиційних паливно-енергетичних ресурсів та поліпшення стану оточуючого природного середовища.

Станом на 01.01.2021 на території області генерує 57 об'єктів енергетичної інфраструктури з відновлювальних джерел енергії потужністю 553,2671МВт: 53 СЕС потужність 514,9851МВт; 1 ВЕС потужність 32,67МВт; 1 ГЕС потужність 0,9МВт; 2 об'єкта з виробітки електроенергії з біогазу потужністю 4,712 МВт.

Загальний обсяг виробленої електричної енергії об'єктами енергетики з відновлювальних джерел енергії, що розташовані на території Одеської області за 10 місяців 2020 року 647,208 млн кВт·год (останні офіційні дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на дату складання звіту).

Сонячна енергетика займає лідируючу позицію – на 53 об'єктах сонячної енергетики області відпущено 84,59% альтернативної електричної енергії від загального його обсягу.

З початку 2020 року введено в експлуатацію 14 об'єктів енергетичної інфраструктури з відновлюваних джерел енергії потужністю 88,6101МВт (13 СЕС потужністю 85,1011МВт та 1 виробничий об'єкт електрогенераторної /когенераційної/ установки для виробництва електричної енергії потужністю 3,509МВт; запланований відпуск електричної енергії 133,375 млн кВт·год/рік), додаток 7.

Об'єкти сонячної енергетики запрацювали на території Ананьївського, Арцизького, Біляївського, Болградського, Лиманського, Овідіопольського, Тарутинського та Татарбунарського районів, та на території міст Болград, Ізмаїл та Южний.

Наприкінці II-го кварталу 2020 року на територія Великодальницької сільської ради Біляївського району Одеської області (с. Великий Дальник, вул. Шевченко, буд. 248) був введений в експлуатацію другий виробничий об'єкт електрогенераторної (когенераційної) установки для виробництва електричної енергії ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ-ОДЕСА» потужністю 3,509 МВт. Запланований відпуск електричної енергії 24,6 млн кВт*год/рік.

За інформацією отриманої від суб'єктів господарювання, що мають у користуванні об'єкти енергетики, загальна сума залучених інвестицій на проектування та будівництво 14 об'єктів із використанням відновлювальних джерел енергії протягом 2020 року склала більше 100 млн доларів.

На початку березня 2020 року облдержадміністрація підписала три Меморандуми про співпрацю із Овідіопольською районною державною адміністрацією, відповідними територіальними громадами області та компаніями, що забезпечуватимуть реалізацію інвестиційних проектів у сфері вітроенергетики – ТОВ «Овідіополь Енерджі», ТОВ «Овід II», ТОВ «Овід III» загальною потужністю 302 МВт та вартістю понад 440 млн євро.

З початку 2020 року АТ «ДТЕК Одеські електромережі» приєднав до своїх мереж 312 нових приватних сонячних електростанцій загальною потужністю 8,67МВт.

Всього станом на 01.01.2021 в Одеській області 1162 домогосподарства, які виробляють екологічно чисту електроенергію і забезпечують не тільки власні потреби, а й продають залишок в мережу на підставі договорів про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим тарифом, укладених між побутовими споживачами та ТОВ "Одеська обласна енергопостачальна компанія". Встановлена потужність 1162 приватних сонячних електростанцій 27,801 МВт, за 2020 рік згенеровано 31,547 млн кВт*год.


Найбільше виробників екологічно чистої енергії в Овідіопольському районі - 176. Також в п'ятірці лідерів: Одеса - 151, Лиманський - 135, Біляївський райони області - 108 і Ізмаїл - 103.

Відповідно до інформації Держенергrefективність щодо типової фінансової моделі СЕС приватного домогосподарства орієнтовна сума інвестицій за 2020 рік на встановлення приватних сонячних електростанцій майже 14 млн доларів.

Збільшення обсягів використання відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі дасть змогу підвищити рівень диверсифікації джерел енергоносіїв, що сприятиме зміцненню енергетичної незалежності держави та вплине на рівень зайнятості населення регіону.

Даний звіт підготовлений на підставі інформації отриманої від виконавців Програми. Загальні результати виконання заходів Програми за 2020 рік наведені у Додатку 8.

З повагою
Директор



Антон ШАЛИГАЙЛО

**Планові обсяги фінансування заходів Програми
на 2020-2022 роки**

(грн)

№ з/п	Перелік заходів Програми	Всього	обласний бюджет	районний, міський (міст обласного значення) бюджети ОТГ	бюджети сіл селищ, міст районного значення	кошти небюджетних джерел
1.	Модернізація системи електропостачання	відповідно до затверджених інвестиційних програм підприємств та в межах фінансових ресурсів				
2.	Модернізація системи теплопостачання	відповідно до затверджених інвестиційних програм підприємств та в межах фінансових ресурсів				
3.	Модернізація системи водопостачання та водовідведення	відповідно до затверджених інвестиційних програм підприємств та в межах фінансових ресурсів				
4.	Термомодернізація та ремонт будівель	218 163 549	45 036 949	64 490 600	2 850 000	105 786 000
5.	Ремонт вуличного освітлення, встановлення світлодіодних ламп	14 030 237	5 649 737	3 601 500	1 779 000	3 000 000
6.	Модернізація систем теплопостачання (встановлення енергоефективного обладнання), технічне переоснащення та встановлення нових котлів на АВД	127 500 324	4 398 124	38 702 200	1 200 000	83 200 000
7.	Модернізація системи водопостачання та водовідведення, встановлення енергоефективного обладнання	31 834 920	2 250 000	21 447 000	2 137 920	6 000 000
8.	Встановлення вузлів обліку електричної та теплової енергії, холодної води та газу	у межах фінансових ресурсів				
9.	Розробка та впровадження системи енергетичного менеджменту	28 110 000	0	28 110 000	0	у межах фінансових ресурсів
10.	Реалізація заходів з енергоефективності на об'єктах комунальної власності	обсяг фінансування визначається рішенням сесії Одеської обласної ради про затвердження обласного бюджету на відповідний рік				
11.	Проектування та будівництво об'єктів із використанням відновлювальних джерел енергії	у межах інвестиційних проектів				
	Всього	419 639 030	57 334 810	156 351 300	7 966 920	197 986 000

**Проведення модернізації систем електропостачання ДТЕК «ОДЕСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 2020 рік**

№ з/п	Найменування об'єкту, адреса	Кошти небюджетних джерел, тис грн		Виконання заходів, %
		план	факт	
1	Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ від ЗТП 18 Л1 Б-Дністровський РЕМ	429,30	429,30	100,0
2	Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ від ЗТП 10 Л2 Б-Дністровський РЕМ	213,29	212,99	99,9
3	Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ від ТП 29 Л1, Л2 Б-Дністровський РЕМ	453,49	452,96	99,9
4	Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ ТП-31 Лиманський РЕМ	1149,55	1139,42	99,1
5	Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ ЗТП 1029 Л3; ПЛІ-0,4 кВ ЗТП-1028 Л8, Ізмаїльський РЕМ	1493,04	1492,47	100,0
6	Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ ЗТП 1076 Л6; ПЛІ-0,4 кВ ЗТП-1076 Л9, Ізмаїльський РЕМ	1232,38	1214,55	98,6
7	Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ ЗТП 1019 Л1; ПЛІ-0,4 кВ ЗТП-1067 Л9, Ізмаїльський РЕМ	1091,43	1066,94	97,8
8	Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ від КТП 1045 Л1 м.ІзмаїльІзмаїльський РЕМ	522,72	519,53	99,4
9	Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ ТП-421 в м. Кілія, Кілійський РЕМ	1533,59	1515,31	98,8
10	Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ ТП 1526 с.Розовка, Татарбунарський РЕМ (Саратська дільниця)	819,69	808,84	98,7
11	Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ від КТП-1491 Л1; ПЛІ-0,4 кВ КТП 1491 Л4; обладнання КТП 1491 с. Менайлівка, Татарбунарський РЕМ	610,61	610,60	100,0
12	Реконструкція ПЛІ-0,4 ТП-358 Л1, Л2, обладнання КТП 358, ПЛІ-0,4 кВ ЩТП 171 Л1, ПЛІ-10 кВ Фрунзе, смт. Великодлинське, Овідіопольський РЕМ	809,80	777,82	96,1
13	Реконструкція ПЛІ 0,4 кВ від ТП 159 Л2,Л3, ПЛІ-10 кВ Фрунзе, Овідіопольський РЕМ	342,30	343,46	100,3
14	Реконструкція ПЛІ-10 кВ ф.ХПП, Лиманський РЕМ	2076,59	2039,97	98,2
15	Реконструкція мереж Біляївського РЕМ: ПЛІ-6 кВ Кр.Маяк; ПЛІ-0,4 кВ ЗТП 129 Л1, Л2; ЩТП 6/0,4 кВ в с. Маяки	2204,71	2169,07	98,4
16	Реконструкція мереж Біляївського РЕМ: ПЛІ-10 кВ Птичник; ПЛІ-0,4 кВ ЗТП-557 Л1; ЩТП №1 10/0,4 кВ; ЩТП №2 10/0,4 кВ	1182,33	1182,33	100,0
17	Реконструкція мереж Біляївського РЕМ: ПЛІ-10 кВ В.Балка; ПЛІ-0,4 кВ КТП 666 Л1, Л2; ЩТП №1 10/0,4 кВ; ЩТП №2 10/0,4 кВ в с. В.Балка	2845,19	2839,67	99,8
18	Реконструкція мереж Біляївського РЕМ: ПЛІ-10 кВ Х.Балка; ПЛІ-0,4 кВ КТП 831; ПЛІ-0,4 кВ КТП 840; ЩТП 10/0,4 кВ в с. Х.Балка	2291,37	2291,37	100,0
19	Реконструкція мереж Лиманського РЕМ: ПЛІ-10 кВ Море; ПЛІ-0,4 кВ ТП-241; ЩТП 10/0,4 к в с. Сичавка	1770,15	1744,66	98,6
20	Реконструкція мереж Лиманського РЕМ: ПЛІ-10 кВ Капітанівський; ПЛІ-0,4 кВ від ТП-189; ЩТП 10/0,4 кВ в с. Н.Миколаївка	1756,38	1756,38	100,0
21	Реконструкція мереж Лиманського РЕМ: ПЛІ-10 кВ ОПБ-2; ПЛІ-0,4 кВ від ТП-722; ПЛІ-0,4 кВ від ТП-30; ЩТП 10/0,4 кВ в с. Олександрівка	1591,88	1591,88	100,0
22	Реконструкція мереж Овідіопольського РЕМ: ПЛІ-6 кВ Надлиманський; ПЛІ-0,4 кВ ТП-333; ПЛІ-0,4 кВ ТП-334; ЩТП 6/0,4 кВ в с. Надлиманське	1819,29	1819,29	100,0
23	Реконструкція мереж Овідіопольського РЕМ: ПЛІ-10 кВ Сосячний; ПЛІ-0,4 кВ ТП-562; ЩТП 10/0,4 кВ в с. К.-Бугаз	1130,85	1130,85	100,0
24	Реконструкція мереж Овідіопольського РЕМ: ПЛІ-10 кВ Держплемстанція; ПЛІ-0,4 кВ ТП-422; ПЛІ-0,4 кВ ТП-556; ЩТП 10/0,4 кВ в с. Н. Долина	1209,20	1209,20	100,0
25	Реконструкція мереж Овідіопольського РЕМ: ПЛІ-10 кВ Курортний; ПЛІ-0,4 кВ ТП-84; ПЛІ-0,4 кВ ТП-471; ЩТП 10/0,4 кВ; в с. Роксолани	2772,08	2673,95	96,5
26	Реконструкція мереж Роздільнянського РЕМ: ПЛІ-10 кВ ф. Фрунзе; ПЛІ-0,4 кВ ТП -422, ЩТП 10/0,4 кВ в с. Чобручі	1504,47	1489,88	99,0
27	Реконструкція мереж Роздільнянського РЕМ: ПЛІ 10-кВ ф. СПТУ; ПЛІ-0,4 кВ КТП 140, ЩТП 10/0,4 кВ с. Степове	1596,63	1581,31	99,0
28	Реконструкція мереж Арцизького РЕМ Тарутинської ТД: ПЛІ-10 кВ Березино; ПЛІ-0,4 кВ КТП 52 Л1; ЩТП 10/0,4 кВ; ПЛІ-0,4 кВ ЩТП Л1,Л2,Л3 смт. Березине	2063,97	2003,24	97,1
29	Реконструкція мереж Арцизького РЕМ: ПЛІ-0,4 кВ ТП 190; ПЛІ-0,4 кВ КТП 190 Л2; ПЛІ-10 кВ Холмське; ЩТП 10/0,4 кВ; ПЛІ-0,4 кВ ЩТП Л1, Л2;, с. Холмське	3152,04	3070,49	97,4
30	Реконструкція мереж Болградського РЕМ: ПЛІ-10 кВ 8 Березня; ПЛІ-0,4 кВ ТП 577 Л2; ЩТП 10/0,4 кВ; ПЛІ-0,4 кВ ЩТП Л1,Л2,Л3 в с. Городне	1353,05	1353,05	100,0
31	Реконструкція мереж Татарбунарського РЕМ: ПЛІ 10 кВ Кутузова; ПЛІ-0,4 кВ ТП-232 Л1, Л2, Л3; ПЛІ-0,4 кВ КТП 234 Л1; Л2; ЩТП №1 10/0,4 кВ; ПЛІ-0,4 кВ від ЩТП №1 Л1,Л2,Л3; ЩТП №2 10/0,4 кВ; ПЛІ-0,4 кВ від ЩТП №2 Л1,Л2,Л3 в с. Білолісся	2028,93	2027,19	99,9
32	Реконструкція мереж Татарбунарського РЕМ: ПЛІ 10 кВ Приморське; ПЛІ-0,4 кВ ТП-419 Л1, Л2; ЩТП №1 10/0,4 кВ; ПЛІ-0,4 кВ ЩТП №1 Л1,Л2,Л3,Л4; ЩТП №2 10/0,4 кВ; ПЛІ-0,4 кВ ЩТП №2 Л1,Л2,Л3,Л4,Л5 в с. Приморське	2564,13	2531,15	98,7
33	Встановлення реклоузерів 6-10 кВ на ПЛІ-10кВ Лоцман Б-Дністровський РЕМ	490,05	489,42	99,9
34	Встановлення реклоузерів 6-10 кВ на ПЛІ-10кВ Карналіївка Б-Дністровський РЕМ	493,69	493,04	99,9
35	Встановлення реклоузерів 6-10 кВ на ПЛІ-10кВ Миколаївка Б-Дністровський РЕМ	492,89	492,24	99,9
36	Встановлення реклоузерів 6-10 кВ на ПЛІ-10кВ Березань Біляївський РЕМ	503,49	503,49	100,0
37	Встановлення реклоузерів 6-10 кВ на ПЛІ-10кВ Опитне Біляївський РЕМ	509,36	509,36	100,0
38	Встановлення реклоузерів 6-10 кВ на ПЛІ 10 кВ Дайберг Чорноморський РЕМ	514,40	514,40	100,0
39	Встановлення реклоузерів 6-10 кВ на ПЛІ-10 кВ Держплемстанція Овідіопольський РЕМ	501,15	501,15	100,0
40	Встановлення реклоузерів 6-10 кВ на ПЛІ-10 кВ Україна Овідіопольський РЕМ	1014,33	1014,33	100,0
41	Встановлення реклоузерів 6-10 кВ на ПЛІ 10 кВ Миколаївка Овідіопольський РЕМ	513,15	504,59	98,3
	ВСЬОГО	52646,94	52111,14	

**Термомодернізація та ремонт будівель бюджетної сфери
Одеської області за 2020 рік за рахунок обласного бюджету
(виконавець робіт КП «Облтрансбуд»)**

<i>Найменування об'єкту, адреса</i>	<i>Обсяг фінансування з обласного бюджету, тис грн</i>
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Віталія Шума 6-а в м.Чорноморськ	846,8114
Капітальний ремонт будівель (внутрішніх приміщень) фельдшерсько-акушерського пункту за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Козацьке, вул. Сонячна, буд. 7	99,9958
Капітальний ремонт Випаснянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою с. Випасне, вул. Кишинівська, 208 Білгород-Дністровського району Одеської області	514,9019
Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) у Семенівській школі Білгород-Дністровського району	249,394
Капітальний ремонт (даху) школи с.Красна Коса Білгород-Дністровського району	947,694
Капітальний ремонт у Випаснянській школі №1 Мологівської ОТГ Білгород-Дністровського району (роботи з енергозбереження)	199,514
Капітальний ремонт будівель (заміна вікон) сільської лікарської амбулаторії за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с.Випасне, вул. Кишинівська, 187	89,78
Капітальний ремонт фасаду та прибудинкової території будинку культури с.Дельжилер Татарбунарського району Одеської області	1198,89
Капітальний ремонт КУ дошкільної освіти (ясла-садок) "Незабудка" комбінованого типу Татарбунарської районної ради Одеської області	596,56
Капітальний ремонт Нерушайської сільської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини	598,53
Капітальний ремонт КЗ "Струмківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів -ДНЗ" Татарбунарського району	299,998
Капітальний ремонт будівлі КЗ "Білоліська ЗОШ І-ІІІ ступенів" Татарбунарської районної ради	129,995
Капітальний ремонт будівлі КЗ "Глибоківська ЗОШ І-ІІІ ступенів" Татарбунарської районної ради Одеської області	139,99
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в НВК «Плосківська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» с. Плоске, Балтського району, Одеської області	82,341
Капітальний ремонт (заміна приладів електроосвітлення) на ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: с.Новоселівка, Подільського району, Одеської області	311,98
ВСЬОГО	6 306,375

Термомодернізація та ремонт будівель бюджетної сфери Роздільнянського району за 2020 рік

Перелік заходів	Об'єкт	Обсяг та джерела фінансування, тис грн								Виконання заходів, %
		Всього, у т.ч.		Обласний бюджету		Районні, міські (міст обласного значення), бюджети ОТГ		Бюджети сіл, селищ, міст районного значення		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
Капітальний ремонт покрівлі	ФАП Єрміївської сільської ради	150,00	148,00					150,00	148,00	100
Капітальний ремонт фасаду та заміна вікон	Роздільнянська ЗОШ I-III ступенів №2 Роздільнянської районної ради	977,477	908,075			977,477	908,075			100
Капітальний ремонт будівлі та заміна вікон	Яковлівська ЗОШ I-III ступенів	1087,3	1052,955	170,0	169,595	917,38	883,36			100
Капітальний ремонт будівлі, заміна вікон та дверей	Калантаївська ЗОШ I-III ступенів	409,983	409,102	180,0	179,56	229,983	229,542			100
Капітальний ремонт будівлі	Інфекційне відділення КНП СВТГ РР «Роздільнянська центральна лікарня»	553,00	533,0			553,00	533,0			100
Капітальний ремонт	Роздільнянський районний палац культури, вул. Європейська, 36, м. Роздільна	806,24	485,71			806,24	485,71			60,24
Капітальний ремонт	Будинок культури с. Кам'янка, Кам'янська сільська рада	1500,00	1495,33					1500,00	1495,33	100
Капітальний ремонт фасаду адмінбудівлі	Степанівська сільська рада	1447,73	1447,73					1447,73	1447,73	100
Капітальний ремонт будівлі	Лиманська ЗОШ I-III ст. № 1 Роздільнянського району	800,0	793,36	800,0	793,36					100
Капітальний ремонт та придбання вікон	Новоукраїнська ЗОШ I-III ступенів Роздільнянської районної ради	310,0	277,87			310,0	277,87			100
Капітальний ремонт будинку культури	с. Єгорівка	665,63	221,38					665,63	221,38	33,26
Капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі	Єгорівська сільська рада	242,6	242,52					242,6	242,52	100
Капітальний ремонт покрівлі будівлі	ФАП Єрміївської сільської ради	148,0	147,64					148,0	147,64	100
Капітальний ремонт будинку культури	с. Калантаївка	580,0	543,81					580,0	543,81	100
Капітальний ремонт адмінбудівлі	Калантаївська сільська рада	415,0	367,5					415,0	367,5	100
Капітальний ремонт будинку культури	с. Кучурган	415,0	415,0					415,0	415,0	100
Капітальний ремонт спортивної зали	Кучурганська ЗОШ I-III ступенів імені П. М. Каплуна	1100,0	1092,52	1100,0	1092,52					100
Капітальний ремонт фасаду будівлі	Бурдівська ЗОШ I-III ступенів	257,536	257,536			257,536	257,536			100
Завершення ремонтних робіт	Новоукраїнський ФАП	75,0	75,0			75,0	75,0			100
ВСЬОГО		11 940,5	10 914,04	2 250,0	2 235,04	4 126,62	3 650,09	5 563,96	5 028,91	

СТАН ПРОДОВЖЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ ТА ЇХ БЮДЖЕТІВ за 2020 рік

(відшкодування відсотків/суми кредитів залученими фіз. особами, ОСББ, ЖБК на впровадження ЕЕ заходів)

(тис грн)

№	ОБЛАСТЬ/МІС ТО	Програми	Що відшкодується / Частина відшкодування / кому відшкодується	КОМПЕНСАЦІЯ з місцевих бюджетів	
				Кількість позичаль ників	Сума компенсації
1	Одеська область	Обласна цільова програма компенсації частини кредитів, які беруться населенням області (фізичними особами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами (ОСББ, ЖБК) для впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житла на 2020 рік	Частина суми кредиту 1. ОСББ, ЖБК: до 20% (включно) від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 100 тис. грн. 2. Фіз. особи один раз на рік: - до 10% (включно) від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 12 тис. грн за 1 кредитним договором, на придбання твердопаливних котлів; - до 15% (включно) від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 5,0 тис. грн за кредитним договором на інші заходи з енергозбереження. (ОСББ, ЖБК, ФО)	-	-
2	Арцизький район	Програма енергоефективності Арцизького району на 2019-2020р.	Частина тіла кредиту: 20% котлів, 35% ЕЕ матеріалів, +5% ЕЕ матеріалів від місцевого бюджету (ОСББ, ФО)	-	-
3	Ананьївський район	Районна цільова програма відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими населенням Ананьївського району на впровадження енергозберігаючих заходів на 2020-2022 роки	25 % від відсоткової ставки за кредитами на впровадження енергозберігаючих заходів	-	-
4	м. Балта	Програма підтримки діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Балтській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки	1) Умови співфінансування (від загальної кошторисної вартості робіт): вартість капітального ремонту складає до 50 тис.грн. – 50% бюджет, 50% власні кошти ОСББ; - вартість капітального ремонту складає більше 50 тис.грн. – 70% бюджет, 30% власні кошти ОСББ. 2) 20% - відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами для ОСББ, які впроваджують заходи з енергозбереження	-	-
5	м. Білгород- Дністровськ	Програма «Утеплення багатоквартирних будинків «Тепле житло»	Частина суми кредиту. Ремонтно-будівельні роботи до 50%; , кредит на придбання матеріалів на утеплення зовнішніх стін по загальнодержавній -максимальна частка міського бюджету має складати 60 % від вартості (без вартості матеріалів). (ОСББ)	-	-
6	м. Болград	Міська цільова програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження та термомодернізації в м. Болград, на 2019-2020 роки	Відшкодування частини кредитів з бюджету м. Болград здійснюється ОСББ розмірі до 20 відсотків (включно) від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 50,0 тис.грн за кредитним договором на заходи з енергозбереження, згідно з цією Програмою	2	27,4
7	Біляївська ОТГ	Програма сприяння створенню та підтримки функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Біляївській об'єднаній територіальній громаді на 2019 – 2021 роки	Умови співфінансування (50 % - місцевий бюджет; 50% - кошти ОСББ)	-	-
8	м. Одеса	Міська цільова програма відшкодування частини кредитів на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, на 2019-2020 роки	Частина суми кредиту: для ОСББ, ЖБК, - до 40% від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 20 тис.грн. за кредитним договором; - до 35% від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 300,0 тис.грн. за кредитним договором (ОСББ, ЖБК)	66	8477,06
9	м. Чорноморськ	Програма енергозбереження та енергоефективності Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2022 роки	Частина основної суми кредиту та частина відсотків: 1) "населення": до 20% (включно) від розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 5,0тис.грн. за кредитним договором, 50% від суми сплачених % за отримані кредити на заходи з енергозбереження та 70% від суми оплочених %; 2) "ОСББ", "ЖБК" до 50% (включно) від розміру основної суми кредиту, але не більше 200,0тис.грн. за кредитним договором, 50% від суми сплачених % за отримані кредити на заходи з енергозбереження та 70% від суми сплачених відсотків за отримані кредити (ОСББ, ЖБК, ФО)	22	206,4
10	м. Южне	Програма фінансової підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Южному на 2017-2021 роки	Умови співфінансування (80% - міський бюджет; 20% - кошти ОСББ)	9	5742,421
	ВСЬОГО			99	14 453,281

Модернізація системи водопостачання та водовідведення за 2020 рік (Розділянський район)

Перелік заходів	Адреса об'єкта	Всього у т.ч		Бюджети сіл, селищ, міст районного значення		Кошти небюджетних джерел		Віконання заходів, %
		план	факт	план	факт	план	факт	
Модернізація насосної станції підкачки води, ремонт водогону, придбання енергозберігаючих глибинних насосів	Виноградарська сільська рада: с.Вакуловка	186,38	146,38	171,38	131,38	15,0	15,0	78,53
Капітальний ремонт артезианської свердловини	Старостинська сільська рада: с.Нові Чобручі	333,6	292,6	333,6	292,6	-	-	100
Реконструкція систем водопостачання	м.Роздільна вул.Кишинівська та провул.Мічурина	186,0	135,7	186,0	135,7	-	-	100
Реконструкція водопровідної мережі та системи водовідведення	м. Роздільна	137,08	137,08	137,08	137,08	-	-	100
Реконструкцію модуля системи знезалізнення води	м. Роздільна	1184,175	1165,52	1184,175	1165,52	-	-	100
Будівництво каналізаційної насосної станції	м.Роздільна вул.Європейська, 73,75	200,0	199,4	200,0	199,4	-	-	100,0
Придбання глибинних насосів	Єреміївська сільська рада	50,0	44,0	50,0	44,0	-	-	100,0
Капітальний ремонт водомережі		244,00	243,3	244,0	243,3	-	-	100,0
Капітальний ремонт сан.зони з влаштуванням глибинного насоса 5 свердловин	Кам'янська сільська рада: с.Кам'янка, Покровка, Володимирівка	1544,45	1544,45	1544,45	1544,45	-	-	100,0
Капітальний ремонт артезианської свердловини та водопроводу	Марківська сільська рада: с.Вапнярка, Петрівка	1400,0	1260,65	1400,0	1260,65	-	-	100,0
Будівництво артезианської свердловини	Кам'янська сільська рада: с.Матишівка	1124,35	1124,31	1124,31	1124,31	-	-	100,0
Капітальний ремонт водогону	Степанівська сільська рада: с. Степанівка	650	596,36	650	596,36	-	-	100,0
Капітальний ремонт водогону та придбання енергозберігаючих насосів для башти рожновського	Щербанська сільська рада	326,03	325,77	326,03	325,77	-	-	100,0
Придбання енергозберігаючих насосів і каскади	Буценівська сільська рада	130,0	53,76	130,0	53,76	-	-	41,35
Придбання обладнання для артезианської свердловини	с. Матишівка вул. Дружби	127,4	127,4	127,4	127,4	-	-	100
Придбання енергозберігаючих глибинних насосів до водонапірної башні	Старостинська сільська рада	152,83	152,83	152,83	152,83	-	-	100
ВСЬОГО		8 040,6	7 645,7	8 025,6	7 630,7	15,0	15,0	

Введені в експлуатацію протягом 2020 року об'єкти енергетичної інфраструктури з відновлюваних джерел енергії на території Одеської області

	Об'єкт енергетичної інфраструктури з ВДЕ	Місцезнаходження	Забудовник/Інвестор	Потужність, МВт	Запланований відпуск енергії, млн кВт*год/рік
Ананьївський район	Фотовольтанічна станція "Ананьїв"	Одеська область, Ананьївський район, м. Ананьїв вул. Гагаріна, 816	ПрАТ «Інвестор»	3,599	4,157
Арцизький район	Наземна СЕС	Одеська область, Арцизький район, с. Павлівка, територія Павлівської сільської ради (за межами населеного пункту)	ТОВ «АРЦИЗ СОЛАР»	17,728	21,632
м. Ізмаїл	Наземна СЕС	вул. Семена Чернова, 153, м. Ізмаїл, Одеська область	ТОВ "Гудзовка-Солар-1"	12,156	16,793
	Наземна СЕС	вул. Семена Чернова, 151, м. Ізмаїл, Одеська область	ТОВ "Гудзовка-Солар 2"	12,156	16,828
Лиманський район	Наземна СЕС	Одеська область, Лиманський район, територія Визирської сільської ради	ТОВ «ОЕНЖІ ЕНЕРДЖІ»	5,4	6,789
Болградський район	Наземна СЕС	Одеська область, Болградський район, територія Залізничненської сільської ради	ТОВ «Солар Болград»	6,256	7,035
	Наземна СЕС	Одеська область, м. Болград, вул. Поштова, 135 та вул. Поштова, 84	ТОВ "Болград Еліос"	6,163	8,967
Тарутинський район	Наземна СЕС "Ярове"	Одеська область, Тарутинський район, с. Ярове, 3 черга	ТОВ "Тарутине Солар 4"	1,24	1,24
Овідіопольський район	Дахова сонячна електростанція	Одеська обл., Овідіопольський район, смт Великодолинське, вул. Транспортна, 1 - В	ТОВ «Мостмаренерджи	0,233	0,29
м. Подільськ	Наземна СЕС	Одеська область, м. Подільськ, вул. Соборна	ТОВ "Подільськ Грін Енерджи"	5,732	6,266
Татарбунарський район	Наземна СЕС	Територія Білоліської сільської ради Татарбунарського району Одеської області (за межами населеного пункту)	ТОВ «РЕД ФОРЕСТ»	13,919	18,271
м. Южне	Наземна СЕС	м. Южне, вул. Комунальна, 15)	ТОВ "ЕНЕРГЕЙН"	0,463	0,428
м. Одеса	дахова сонячна електростанція	м. Одеса, вул. Капітана Кузнецова, буд. 114	ТОВ «Керуюча компанія «Суворовський»	0,0561	0,079
Біляївський район	Виробничий об'єкт електрогенераторної (когенераційної) установки для виробництва електричної енергії	Біляївський район, с. Великий Дальник, вул. Шевченко, буд. 248	ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ-ОДЕСА»	3,509	24,6
ВСЬОГО				88,6101	133,375

Виконання Регіональної цільової програми енергоефективності Одеської області за 2020 рік

№ з/п	Захід	Виконавці	Планові обсяги фінансування на 2020 рік, грн					Фактичні обсяги фінансування за 2020 рік, грн					Викона ння заходів, %
			Всього	обласний бюджет	районний, міський (міст ОЗ) бюджет ОТГ	бюджети сіл селищ, міст районного значення	кошти небюджетних джерел	Всього	обласний бюджет	районний, міський (міст ОЗ) бюджет ОТГ	бюджети сіл селищ, міст районного значення	кошти небюджетних джерел	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Назва напрямку (завдання)													
1.	Модернізація системи електропостачання	Енергетичні підприємства	у межах інвестиційних програм підприємств	-	-	-	-	52 128 140	-	-	-	52 128 140	-
2.	Модернізація системи теплопостачання		-	-	-	-	21 358 454	-	-	-	21 358 454	-	
3.	Модернізація системи водопостачання та водовідведення		-	-	-	-	13 296 360	-	-	-	13 296 360	-	
4.	Термомодернізація та ремонт будівель	Виконавчі комітети міст обласного значення, органи місцевого самоврядування, Департамент СЖ та Е облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, КП «Одеська обласна енергозберігаюча компанія», КП «Облтрансбуд»	104 659 549	43 137 200	22 886 600	1 050 000	35 686 000	119 536 271	23 306 849	53 586 625	10 647 749	31 995 048 *	114,21
5.	Ремонт вуличного освітлення, встановлення світлодіодних ламп		8 719 237	5 649 737	1 390 500	679 000	1 000 000	50 074 423	4 585 907	31 152 899	14 335 617	-	574,3
6.	Модернізація систем теплопостачання (встановлення енергоефективного обладнання), технічне переоснащення та встановлення нових котлів на АВД		63 300 324	4 398 124	16 102 200	400 000	42 400 000	55 995 343	1 564 073	51 124 320	3 306 950	-	88,46
7.	Модернізація системи водопостачання та водовідведення, встановлення енергоефективного обладнання		17 629 640	2 250 000	12 347 000	1 032 640	2 000 000	77 320 152	1 327 380	60 716 422	14 774 150	502 200	438,58
8.	Встановлення вузлів обліку електричної та теплової енергії, холодної води та газу	Енергетичні підприємства	у межах фінансових ресурсів	-	-	-	-	2 980 260	-	2 849 700	21 000	109 560	-
9.	Розробка та впровадження системи енергетичного менеджменту	Органи місцевого самоврядування, КП "Одеська обласна енергозберігаюча компанія"	9 370 000	-	9 370 000	-	-	80 000	-	80 000	-	-	0,85
11.	Реалізація заходів з енергоефективності на об'єктах комунальної власності	Департамент СЖ та Е облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, КП «Одеська обласна енергозберігаюча компанія»	у межах фінансових ресурсів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Проектування та будівництво об'єктів із використанням відновлювальних джерел енергії	Органи місцевого самоврядування, залучені інвестори	** у межах інвестиційних проектів	-	-	-	-	**	-	-	-	-	-
	Всього		201 779 001	55 435 061	62 096 300	3 161 640	81 086 000	392 769 403	30 784 209	199 509 966	43 085 466	119 389 762	-

Примітка:

* кошти інших джерел - 14 875,5 тис грн та за рахунок субвенцій з державного бюджету: медична субвенція – 13 945,4 тис грн, освітня субвенція – 3 174,148 тис грн.

* * За інформацією отриманої від суб'єктів господарювання, що мають у користуванні об'єкти енергетики, загальна сума залучених інвестицій на проектування та будівництво 14 об'єктів із використанням відновлювальних джерел енергії протягом 2020 року склала більше 100 млн доларів. Відповідно до інформації Держенергетичності щодо типової фінансової моделі СЕС приватного домогосподарства орієнтовна сума інвестицій за 2020 рік на встановлення приватних сонячних електростанцій майже 14 млн доларів.
